Saneerausalo

14.4.2022

Yleisaikataulu As Oy Säästökenno
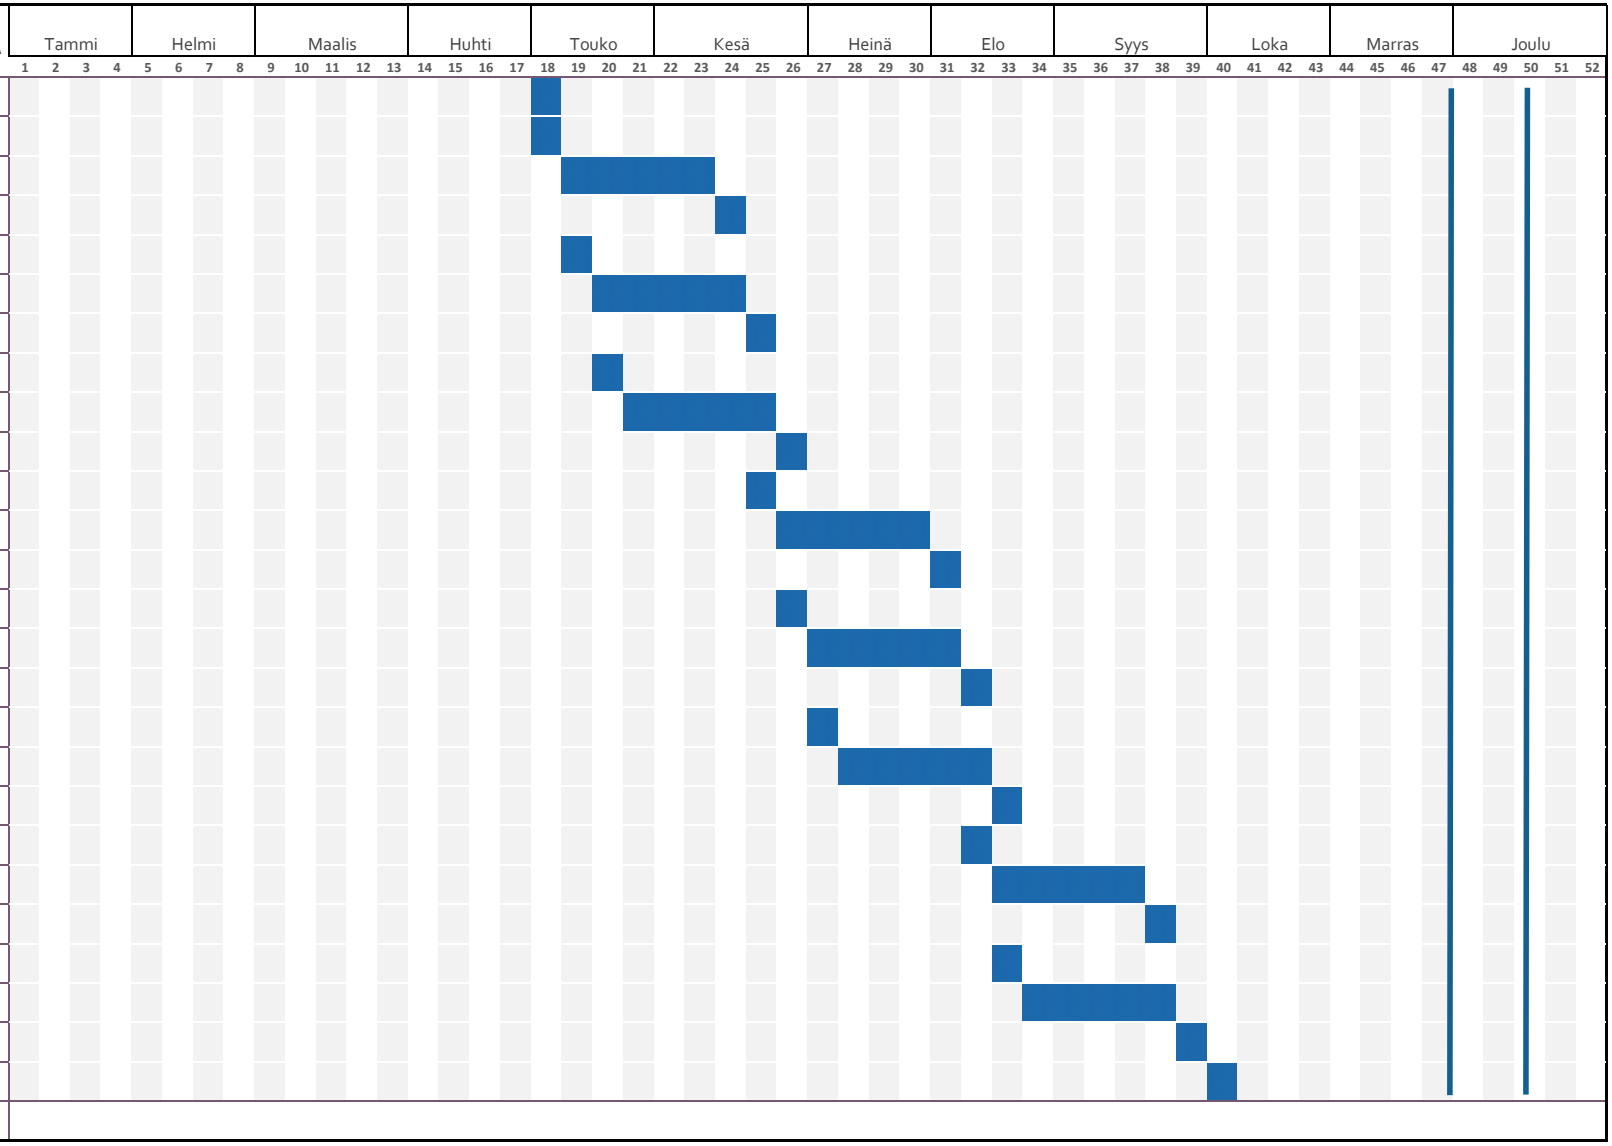
TEHTÄVÄ	ALOITUS VIIKKO	KESTO VIIKOISSA
työmaan aloitus	18	1
Telinetyöt lohko 1	18	1
Telineillä tehtävät työt lohko 1	19	5
Telinepurku lohko 1	24	1
Telinetyöt lohko 2	19	1
Telineillä tehtävät työt lohko 2	20	5
Telinepurku lohko 2	25	1
Telinetyöt lohko 3	20	1
Telineillä tehtävät työt lohko 3	21	5
Telinepurku lohko 3	26	1
Telinetyöt lohko 4	25	1
Telineillä tehtävät työt lohko 4	26	5
Telinepurku lohko 4	31	1
Telinetyöt lohko 5	26	1
Telineillä tehtävät työt lohko 5	27	5
Telinepurku lohko 5	32	1
Telinetyöt lohko 6	27	1
Telineillä tehtävät työt lohko 6	28	5
Telinepurku lohko 6	33	1
Telinetyöt lohko 7	32	1
Telineillä tehtävät työt lohko 7	33	5
Telinepurku lohko 7	38	1
Telinetyöt lohko 8	33	1
Telineillä tehtävät työt lohko 8	34	5
Telinepurku lohko 8	39	1
valmis	40	1
